

宣城高新投资发展有限公司重点项目建设周简报

[2021]第 7 期

(2021年9月18 日至2021年9月24日)

工 程 进 展

一、科技创新中心项目

- 完成1#2#3#楼深基坑支护设计及施工方案专家论证后修改定稿；
- 1#、2#、3#楼地库开始开挖作业；
- 5#楼基础土方开挖完成，破桩头作业完成。

二、综合医院项目

- 综合医院项目表层渣土清理。
- 综合医院项目试桩图电子版已出，图纸会审结束，打桩机准备进场。

三、立讯精密产业园项目

——8号厂房：

一层，新风管安装完成95%，空调内机安装完成75%；二层，消防管安装完成90%，排烟管道安装完成50%，新风管道安装完成90%，强电桥架安装完成90%。

——7号仓库：

内外墙防水腻子粉刷完成。

——设备用房：

乳胶漆完成80%。

——8号厂房：

一层，新风管安装完成，空调内机安装完成；二层，因管道吊架安装，消防、新风、强电桥架暂停施工，吊架安装完成80%，排烟管道安装完成70%，所有窗扇完成安装。

——7号仓库：

外墙真石漆喷涂完成30%，管道吊架安装开始。

——设备用房：


窗扇完成安装，多联式空调热泵机组设备进场，磁悬浮变频离心式冷水机组设备进场。

四、特种管阀产业园项目

——仓库基础短柱砼浇筑完成，基础墙体砌筑中。

——1#车间1-20轴/A-K轴基础短柱砼浇筑完成。

——2#车间钢结构主构件吊装60根立柱。

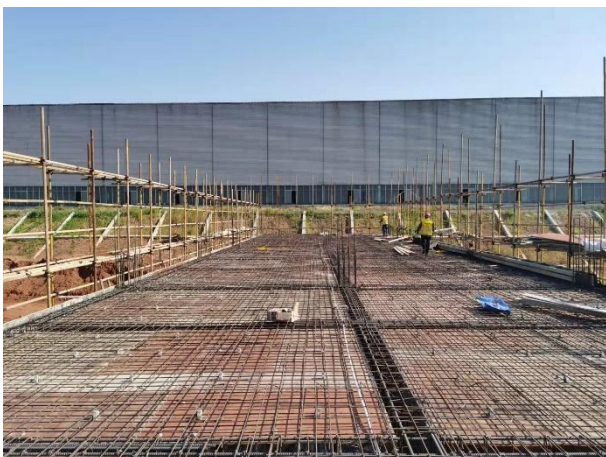

——3#厂房框架部分一层顶板模板安装，外架搭设中。

——4#厂房框架部分一层顶板钢筋验收完成，计划25日砼浇筑。

——5#厂房框架部分屋面模板安装。

五、电力科技产业园一期项目

——办公楼一层砌体砌筑及四层顶板拆模；

- 2#车间3.6m以上墙体砌筑；
- 产品仓库物料提升机走台平台铺设；
- 1#车间填充墙砌筑。

六、新宏小微企业园项目

- 桩基施工已全部施工完成，场地平整；

七、加速器产业园钢结构厂房改造维修项目

- 加速器产业园8#厂房屋面隅撑安装、9#厂房屋面钢梁吊装
- 加速器产业园2#厂房墙面拉条安装

八、慧科生物项目

- 目前项目整体施工已进入收尾阶段，通风柜调试、家具柜体、防火门、生物安全柜及超净工作台已安装完成，家具台面安装中，PH计、电热鼓风干燥箱、精密天平等仪器到货，其他专业正在进行收尾施工。

九、新能源科技产业园项目

- 已完成场地清表土方外运、厂区配电房改仓库及维修工作、场地用电布设、办公区土方平整、2#车间内部墙体及吊顶顶板拆除；
- 新建部分施工图纸正在图审中，桩基已进场；

十、城北新天地项目

- 9月21日，约谈施工单位，对项目施工做质量进度要求；
- 9月24日，施工单位进场进行清表作业。

十一、蒸汽管道项目

- 二号线（万里纸业线）管道安装完成95m。

工作动态

一、科技创新中心项目



——9月24日上午，宣州区人民政府党组成员、副区长方强一行赴项目进行国庆节前安全检查。

——9月22日上午，在项目部会议室召开了宣城高新区科技创新中心一期项目第六次监理例会。



二、综合医院项目



——9月18日，高新区综合医院项目开挖动土。

——9月22日，综合医院第三期监理例会。



三、立讯精密产业园项目



——9月21日上午，高新区管委会工会主席郑治到立讯二期项目检查指导“三比三学三赶超”工作，高新投公司副总经理郑向东陪同。

——9月19日-20日，中秋节假日期间立讯二期项目各班组夜间继续加班加点施工作业



四、特种管阀产业园项目



——9月22日下午，在项目部会议室召开了特种管阀项目第十五次监理例会

五、新宏小微企业园项目

——9月22日召开第二次监理例会



六、城北新天地项目



——9月21日，约谈施工单位，
对项目施工做质量进度要求。

——9月24日，施工单位进场进行
清表作业。



存 在 困 难

——蒸汽管道项目：二号线（银顺食品线）金鼎轩酒业段设计图纸与现场实际情况不符的较多，需进行线路优化。四号线（东方希望线）经过乾坤重工厂内，需要协调厂内是否允许我部开挖的问题。
