

宣城高新投资发展有限公司重点项目建设周简报

[2021]第 6 期

(2021年9月10日至2021年9月17日)

工 程 进 展

一、科技创新中心项目

——9月16日上午，宣城高新技术产业开发区科技创新中心一期项目5#楼基础施工开挖，已完成50%。

——9月17日上午，宣城高新技术产业开发区科技创新中心一期项目5#楼基础开挖已全部完成。5#楼桩头破碎完成28根（已完成56%），共50根。

——9月17日，二期勘察外业全面结束。

二、综合医院项目

——综合医院项目挖机、推土机已进场。

三、立讯精密产业园项目

——8号厂房：

一层，新风管安装完成95%，空调内机安装完成75%；二层，消防管安装完成90%，排烟管道安装完成50%，新风管道安装完成90%，强电桥架安装完成90%。

——7号仓库：

内外墙防水腻子粉刷完成。

——设备用房：

乳胶漆完成80%。

四、特种管阀产业园项目

——仓库基础承台梁砼浇筑完成。

——1#车间30-38轴/A-K轴基础承台梁混凝土浇筑。

——2#车间钢结构主构件吊装。



——3#厂房基础土方回填完成。

——4#厂房框架部分一层顶板模板安装，外架搭设中。

——5#厂房框架部分一层顶板钢筋绑扎。

——1#厂房剩余桩基施工完成，砼养护中

五、电力科技产业园一期项目

—— 办公楼一层砌体砌筑；

—— 2#车间砌体砌筑；

—— 1#车间砌体砌筑。

六、新宏小微企业园项目

—— 桩基施工，临建搭设完成；

—— 现场复测高程。

七、加速器产业园钢结构厂房改造维修项目

——加速器产业园8#9#厂房钢结构吊装

——完成加速器产业园2#厂房屋面压瓦

八、慧科生物项目

——目前项目整体施工已进入收尾阶段，通风柜调试、家具柜体、防火门、生物安全柜及超净工作台已安装完成，其他专业正在进行收尾施工。

九、新能源科技产业园项目

——已完成场地清表土方外运、厂区配电房改仓库及维修工作、场地用电布设；

——新建部分施工图纸正在图审中；

十、青年创业园（城北新天地项目）

——9月16日，与施工单位、电力单位现场对接项目临时用电事宜；

——9月17日，对接施工单位及测绘单位现场测量控制点，做好“三通一平”施工准备工作。

十一、蒸汽管道项目

——二号线（万里纸业线）管道安装完成105m。

工 作 动 态

一、科技创新中心项目



——9月15日上午，希尔顿惠庭（中国）总部赴宣城高新区科技创新中心一期项目进行现场勘查，随后赴宣城高新投资发展有限公司会议室与宣城高新投资发展有限公司、中机工程有限公司及安徽祥龙建设集团有限公司召开指导交流会议。

——2021年9月16日上午，宣州区人大常委会党组书记、主任孙国梁及人大常委会一行莅临高新区科创中心项目考察。高新区管委会主任赵流海及相关单位负责同志陪同。



——9月17日上午，建设单位、监理单位、EPC设计及施工单位、基坑支护设计单位项目负责同志及特邀专家在项目部会议室组织召开了科创中心一期项目基坑支护设计专家论证会。





——9月17日下午，建设单位、监理单位、勘察单位、EPC设计及施工单位项目负责同志及特邀专家在项目部会议室组织召开了科创中心一期项目基坑支护施工方案及5号楼高支模施工方案专家论证会。

——9月14日上午，在项目部会议室召开了宣城高新区科技创新中心一期项目监理例会。



二、综合医院项目



——9月15日，综合医院项目监理例会。

——9月17日，综合医院项目冲洗设备安装完成，部分施工道路已完善。




三、立讯精密产业园项目



——9月11日上午，高新投公司董事长何启发、副总经理徐平平到立讯二期项目现场检查指导工作，鳌峰集团总经理苗则席陪同。

——9月13日，上周会议确定的平行屋架钢梁的管道吊装方案已开始实施安装。

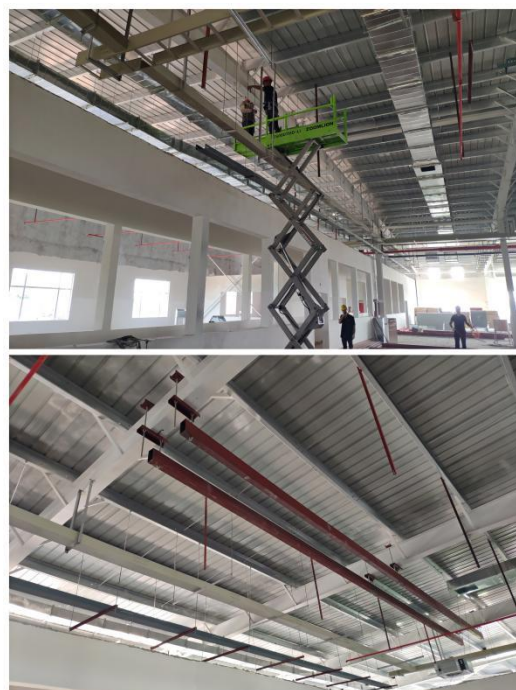

——9月17日，立讯二期8号厂房窗户玻璃开始安装。

四、特种管阀产业园项目

——9月15日下午，由宣城市晨兴建设投资有限公司组织，设计、监理及施工单位共同参与管阀项目室外附属图纸督导会，对该项目室外附属及道路图纸问题进行分析，会上明确出图时间。



——9月14日下午4点，在项目部会议室召开了特种管阀项目第十四次监理例会。

——9月16日上午8时58分，2#车间开始第一根主构件吊装，标志着管阀项目正式进入钢结构主体施工阶段。



——9月17日，1#车间30-38轴/A-K轴基础承台及地梁混凝土浇筑，18000m²基础已全部浇筑完成。

五、电力科技产业园一期项目

——9月14日下午，召开第十六次监理例会



六、新宏小微企业园项目

——桩基施工。



七、青年创业园（城北新天地项目）

——9月16日，与施工单位、电力单位现场对接项目临时用电事宜；





——9月17日，对接施工单位及测绘单位现场测量控制点，做好“三通一平”施工准备工作。

存在困难

——蒸汽管道项目：二号线（银顺食品线）金鼎轩酒业段设计图纸与现场实际情况不符的较多，需进行线路优化。四号线（东方希望线）经过乾坤重工厂内，需要协调厂内是否允许我部开挖的问题，需要协调。

本周大纪事

——特种管阀产业园项目：9月16日上午特种管阀产业园项目2号车间钢结构进场吊装。
